DEVELOPMENT & BUSINESS PLAN

PUMPKIN KNIGHT

育成 × 冒険 × 介入

魔女の魔力を取り戻すため、何度もカボチャの騎士を育て、
旅の途中で運命に干渉するローグライク育成RPG。

Steam 800円 / Nintendo Switch・Switch2 1,000円
開発計画：2027年1月〜6月 | 追加開発・外注予算：600万円

企画・開発：山浦 充 | 2026年11月

02

世界観・ゲームコンセプト

絵本のような魔女の森を舞台に、カボチャの騎士が成長と継承を繰り返す

世界観

魔力を失った魔女と、魂を宿したカボチャの騎士。
選択したルートを進み、試練を越えて失われた魔力の奪還を目指す。

ゲーム体験

バトルだけでなく、料理・錬成で騎士を育成。
一度の敗北も次の騎士へつながる、反復型の育成体験。

目指すプレイ感

かわいらしいビジュアルと、ハロウィンモチーフのダークファンタジー。
短いプレイ単位で試行錯誤と成長を楽しめる。

ゲームの核となる 3つの要素

育成

レベル・スキル・クラフトで育成
灯火・成長の種で次の騎士へ成長をつなぐ

冒険

試練を突破し、魔女の力を取り戻す

介入

おまじないでタイムラインや成長選択に干渉

03

ゲームシステム・プレイサイクル

「育てる → 進む → 試練に挑む → 継承する 」を繰り返し、少しずつ魔女の力を取り戻す

01

騎士を作成

カボチャ・マスク・初期スキルを選択

›

02

1日3回行動

バトル／クラフト／食事・休息

›

03

育成・準備

レベルアップ、閃き、料理・錬成

›

04

試練に挑戦

育成の成果が問われる節目のバトル

›

05

次の騎士へ継承

灯火・成長の種で次回プレイを強化

バトルの特徴：敵味方のスキル発動順をタイムラインで可視化し、
「おまじない」で順番そのものを組み替えられる。

※最終ボス・ルート選択など、一部の進行要素は今後の実装予定。

04

独自性・競合タイトルとの差別化

既存ジャンルの要素を組み合わせ、「順番に介入する」戦闘体験を中心に据える

① タイムラインへの直接介入

多くのオートバトルでは発動順を確認する設計が中心。本作では、おまじないを使って敵味方の発動順をプレイヤー自身が組み替える。

② 育成とクラフトが一体化

戦闘で得た資源を料理・錬成に使用。クラフト結果が騎士の能力に影響し、育成方針を変える。

資源が数値で一元化されているので「A を作るには B・C が必要」という前提がない。クラフトが苦手な方にも訴求可能。

③ 敗北を次のプレイにつなぐ

灯火によるステータス・特性の継承と、成長の種による恒久強化。周回そのものを成長の仕組みにする。

クリア後には高難易度のエンドレスモードが追加され、新しいゲーム体験を提供。

④ 世界観とシステムの一体感

魔女・カボチャ・試練・魔力奪還を、育成・継承・ゲーム機能の解放と結び付ける。

※競合タイトルの網羅的な市場調査は今後実施。現段階では、ゲームシステム上の差別化仮説として整理。

05

ターゲットユーザー

短時間の試行錯誤と、周回による成長・ビルド構築を楽しむ PC／コンソールユーザー

メインターゲット

ローグライク・育成RPG・オートバトルが好きなユーザー。
戦闘の最適化や、周回ごとのビルド変化を楽しむ層。

Nintendo Switch 2では、マウス操作への対応も検討。

サブターゲット

かわいいキャラクターや絵本風の世界観、ハロウィン／ダークファンタジーの雰囲気に惹かれるユーザー。

想定する購入動機

短いプレイ単位

1プレイ約15分を想定。空き時間に遊びやすい

考えるオートバトル

タイムライン操作で戦況を変える

積み上がる成長

敗北後も灯火・成長の種で次回へつながる

※年齢・性別などの属性は現時点で固定せず、Steam体験版やウィッシュリスト反応を見て検証する。

06

開発状況・完成度

基本的なゲームサイクルはプレイ可能。今後は未実装機能の完成と品質・演出の強化に注力

領域	現状	主な内容
基本プレイ・進行	実装済	タイトル、騎士作成、日々の行動、結果画面
バトル・育成	実装済	スキル効果、閃き、合成、タイムライン介入、成長
クラフト・イベント	実装済	料理・錬成、食事、イベント、試練
メタ進行	一部実装	灯火・成長の種。魔櫃コレクション等は未実装
発売に向けた拡張	未実装／調整中	ルート選択、最終ボス、エンドレスモード、セーブ、実績、アイテムの特殊効果、各種設定機能等

現在の強み

実際に操作・プレイできるビルドと主要な遊びの核が存在

今後の重点

未実装機能の完成、UI／アート差し替え、演出・バランス調整

07

販売プラットフォーム・販売価格

PC版を軸に、Nintendo Switchシリーズへ展開する計画

プラットフォーム	想定価格	販売方針	発売時期
Steam	800円	最初の販売・ユーザー獲得の主軸	2027年9月
Nintendo Switch	1,000円	家庭用ゲーム機ユーザーへの展開	2027年年内
Nintendo Switch 2	1,000円	対応可否・追加機能を含めて検討	移植・審査状況に応じて決定

価格設定の考え方

低価格帯で購入ハードルを下げ、短時間で繰り返し遊べるローグライク体験を提供。

※価格は税込の想定。最終価格・地域別価格はパブリッシャーと協議。

販売比率の試算前提（仮置き）

Steam 50%

10,000～12,500本

Switch 35%

7,000～8,750本

Switch 2 15%

3,000～3,750本

※販売比率は現時点の仮定。移植条件・発売順・各ストアの審査結果により見直す。

08

販売目標・ウィッシュリスト目標

販売目標は20,000～25,000本。（ウィッシュリスト以外の発売後の流入も含めた目標　）Steamの事前需要をウィッシュリストで検証

販売後3カ月間の販売目標（全プラットフォーム）

20,000～25,000本

Steam WL目標（仮）

20,000～30,000件 →
50,000～60,000件

Steam販売後1カ月販売目標

10,000～12,500本

ウィッシュリスト目標の置き方

Steam販売比率を50%と想定し、Steam版の販売目標を10,000～12,500本と設定する。

ウィッシュリストから販売本数への転換率は、タイトル・発売時期・マーケティング施策などによって変動する。

How To Market A Gameによる160タイトルの調査では、2023～2025年発売の126タイトルにおける、
発売時点のウィッシュリスト数に対する発売後 1か月の販売本数の中央値は約　22 %となっている（ 2026年10月公開）。

この数値を参考に、ウィッシュリスト 20,000～30,000件を初期の管理目標とし、体験版公開後の獲得実績やイベントなどの反応を踏まえて、
最終目標を50,000～60,000件に更新する。

KPI：ウィッシュリスト数／体験版プレイ数／ストアページ訪問数／フォロー数／発売後レビュー

※ウィッシュリスト目標は市場調査前の仮置き。パブリッシャーの販売計画・広告予算と合わせて調整。

09

売上予測・損益分岐点

価格・販売構成・値引率を仮定した概算。開発予算 600万円の回収ラインを可視化

試算前提

Steam 800円（販売比率50%）

Switch 1,000円（35%）

Switch2 1,000円（15%）


平均値引率：20%

消費税：10%

プラットフォーム手数料：30%

開発予算：600万円

販売本数別の概算手取り（万円）

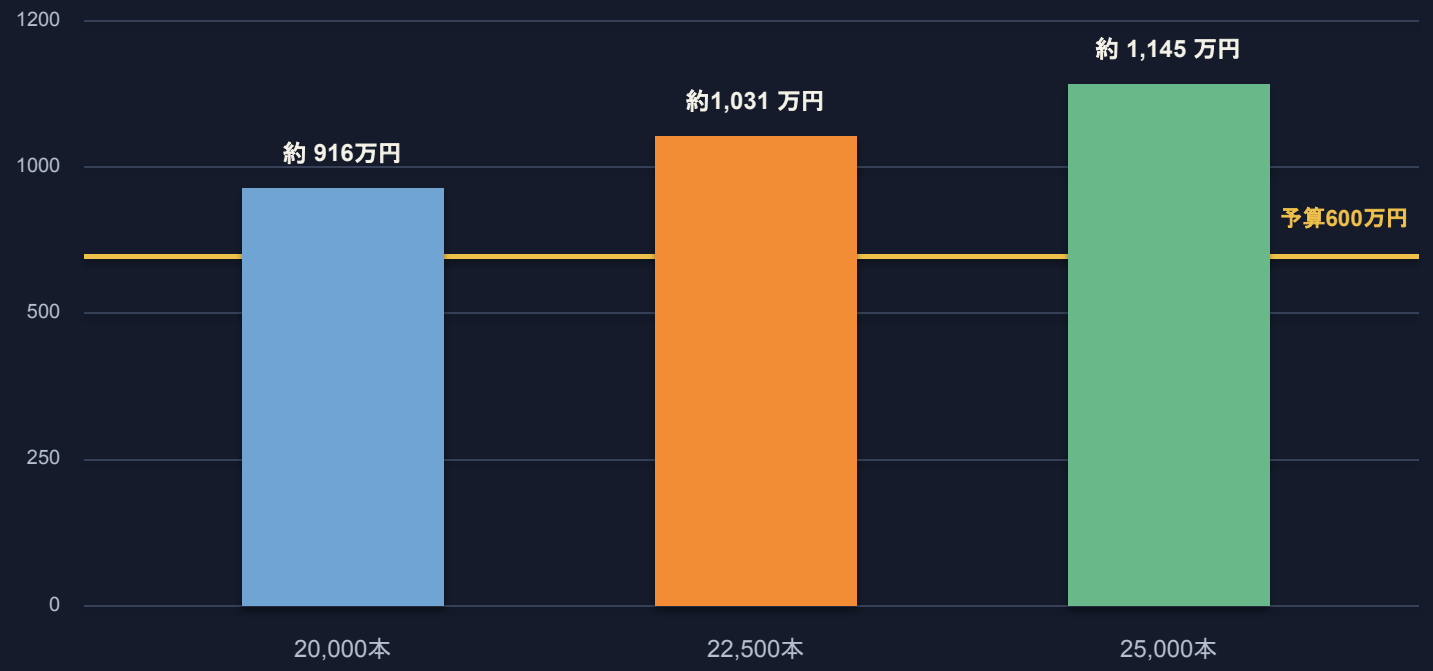

1本あたり概算手取り：約 458円　｜　損益分岐点：約13,101本

※計算式：900円 × 80% ÷ 1.1 × 70% = 約458円。税・プラットフォーム手数料・値引率・販売構成の仮定に基づく概算。 プラットフォーム手数料控除後、パブリッシャー等との収益分配前の金額。
損益分岐点は **開発予算 600万円の回収目安** であり、移植費、翻訳費、広告費、ロイヤリティ等は未計上。

マーケティング計画（ Steam版を基準）

開発中から継続的に情報を発信し、Steamウィッシュリストと体験版の反応を蓄積


開発中	GIF・短尺動画・スクリーンショットを定期公開。開発の進捗と特徴を伝える。
ストア公開	2027年2~3月にSteamストアページを公開し、ウィッシュリスト登録を促進。
体験版	WebGL／Steam体験版を活用し、プレイ動画・フィードバックを収集。
発売前	YouTube紹介動画、SNS告知、インディーゲームイベント・メディアへの露出。
発売後	アップデート情報、ユーザーレビュー、セール・追加施策で継続的に認知を拡大。

パブリッシャーと協議したい支援：広告運用／プレスリリース／配信者・メディア施策／イベント出展

開発スケジュール・必要資金（ Steam版を基準）

2027年1～6月を追加開発・完成期間とし、発売準備・審査を経て 2027年9月発売を目標（2026年内も継続開発中）

コンソール版： Steam版発売後、Nintendo Switch／Switch 2への移植・審査を進め、準備が整い次第、順次発売を目指す。
コンソール版固有の移植・審査・最適化に必要な費用は、今回の開発予算には含まず、別途協議。

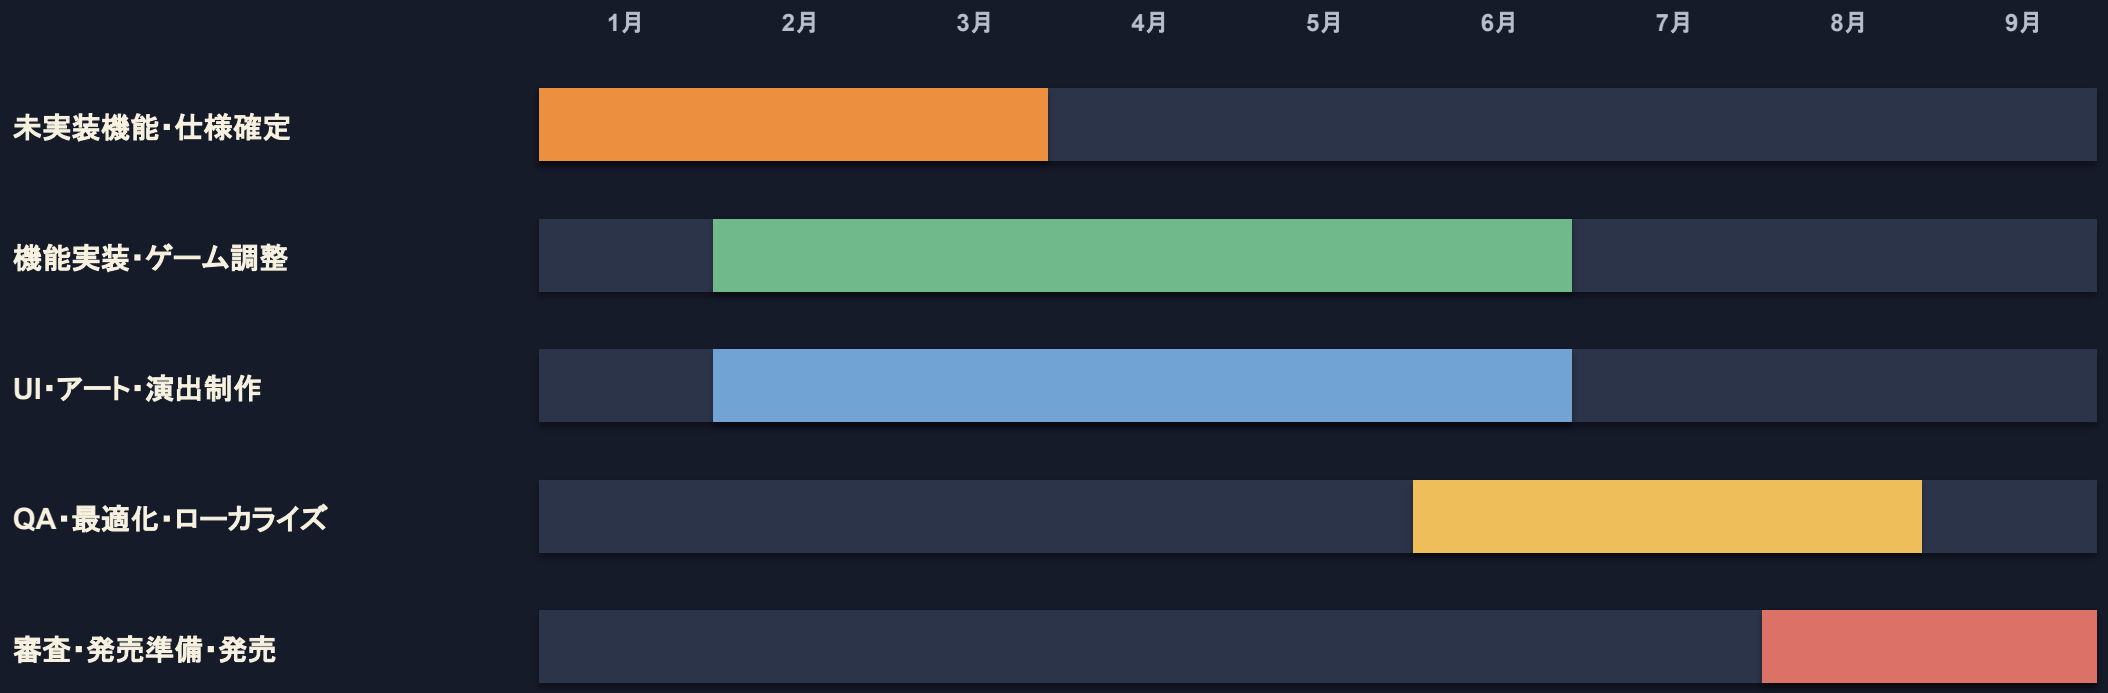

必要資金：総額600万円（想定）

用途	配分（案）
UI・画面デザイン／各種アート	200万円
エフェクト・演出デザイン	150万円
追加制作・実装補助／外注調整	100万円
Steam版のQA・最適化等	100万円
予備費	50万円

資金の主な使途

UI等のデザイン外注、エフェクト制作、演出品質の向上を中心に、完成度と商品力を高める。

コンソール版固有の移植・審査・最適化：別途協議

12 展示会出展・発売前後のプロモーション計画

イベント出展による試遊フィードバックとウィッシュリスト獲得を軸とした発売プロモーション計画

① 試遊・フィードバック
体験版の試遊を通じてゲーム性の検証と改良を継続

② WL(ウィッシュリスト)獲得
出展露出とSNS連動でWL登録目標（5〜6万件）を達成

③ 発売後の販促・継続伸長
発売（9月）前後の認知最大化と秋イベントでの販売拡大

【前半】発売前プロモーション＆ウィッシュリスト蓄積期（2月〜6月）

2月

東京ゲームダンジョン（11/20 申込み予定）

東京（優先予約）

目的：初期試遊検証

アルファ版の試遊体験を提供し、核心要素（タイムライン介入）の操作感と楽しさを検証。

3月

TIGS （申込み済）

TOKYO INDIE GAMES SUMMIT

目的： 試遊検証

春の認知獲得ポテンシャルを維持。2月のゲームダンジョンの落選時カバーにも。

5月

BitSummit

京都（最大級インディー展）

目的：メディア・WL大量獲得

国内外メディア・配信者への露出促進。体験版公開と合わせたWL急増を狙う。

6月

東京ゲームダンジョン

東京

目的：最終調整・直前販促

発売前最終ビルドの試遊。国内コミュニティへの直接訴求と発売直前モーメンタム形成。

【後半】Steam発売＆発売後露出・販売促進期（9月〜11月）

9月【LAUNCH】

Steam 版 正式発売

グローバル配信スタート

目的：初動売上の最大化

蓄積したWLの一斉転換。配信者施策・プレスリリースと同時展開。

10月

全国エンタメ祭り

岐阜（ぜんため）

目的：一般層への認知拡大

発売直後のリアル展示。一般ユーザー・コンソール層へのアプローチと口コミ拡散。

11月

デジゲー博

秋葉原

目的：ロングテール・コミュニティ

コアファン・同人開発コミュニティへの感謝・フィードバック収集と秋セール展開。

パブリッシャーへの依頼内容

開発の完成度を高め、複数プラットフォームでの販売・認知拡大を実現するための協業を希望

① 開発資金

追加開発・外注費として総額600万円の支援を希望。UIデザイン、エフェクト・演出制作等に充当。

② 販売・マーケティング

Steamストア運用、広告・広報、プレス対応、配信者・メディア施策の企画・実行支援。

③ コンソール展開

Nintendo Switch／Switch 2への移植、プラットフォーム審査、QA・最適化に関する知見と実務支援。

④ 海外展開・運営

ローカライズ、海外ストア展開、発売後アップデート・セール施策について協議。

開発・ゲーム仕様の主導は開発者側で継続し、販売・展開面でパブリッシャーの知見とリソースを活用する形を希望。

※支援範囲・契約条件・収益分配・権利関係は、協議のうえ決定したい。
